

Statusopdatering 31. marts - Bording+

Den overordnede tidsplan – afsluttet inden sommerferien – forventes at holde.

Gælder dog ikke afsluttende slidlag – og nok heller ikke væksthuset.

Træer og bundbeplantning til bedene på Borgergade er klar på planteskolen. Plantning afventer, at arbejdet med de større maskiner er færdigt.

Som det kan ses, er næsten halvdelen af Jens Christensens plads ryddet. Klar til multibane og Væksthus.

Legehjørnet på Mødestedet afventer stadig legepladsinspektørens godkendelse. Derfor afskærmet.

Dårlige oversigtsforhold op af Søndergade ved udkørsel fra Bredgade påpeget. Taget til efterretning uden stillingtagen til, hvad der kan/vil blive gjort.


Problemer med skaterområdets indretninger påpeget igen. Lokalerådet retter skriftlig henvendelse til de ansvarlige myndigheder.

Arbejdet på Søndergade vil blive påbegyndt inden længe:

- 1) T-krydset Søndergade/Vestervang bliver langt om.
- 2) Kørebanen på Søndergade fra midt Jens Christensens Plads hen forbi Skov til krydset bliver indsnævret for at give plads til fællestien der forbinder Borgergadestien og Vestervangstien.

Se kortudsnittet

Trafikale justeringer bliver skiltet

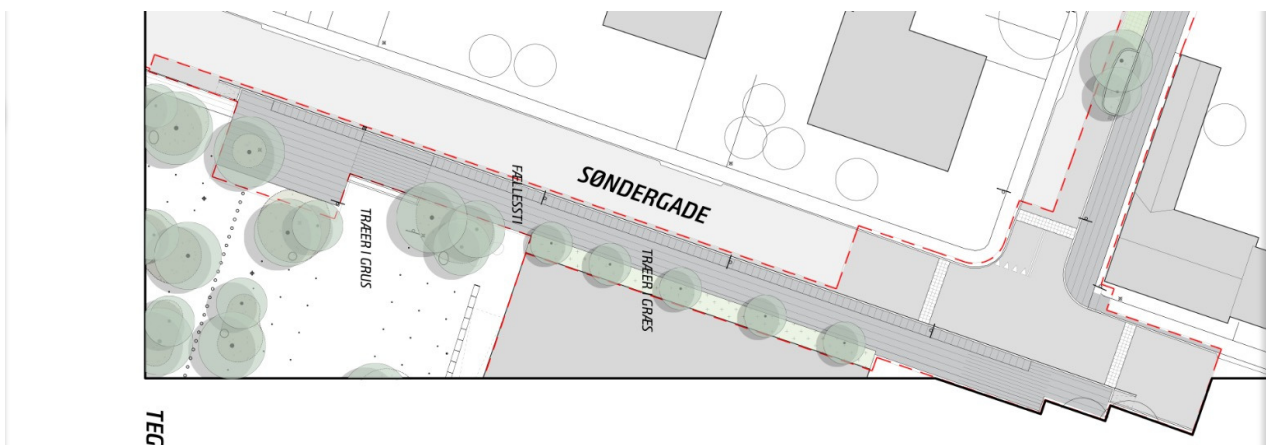

fortsættes

Vedr. fortovsrenoveringen i Bording, så kan du på vedhæftede kort se, hvad der er planlagt i Bording. Der er licitation den 18/4 og arbejdet forventes udført i perioden fra sidst i august til slutningen af oktober. Hertil kommer Vestervang, hvor der i forbindelse med fjernvarmerenoveringen laves nyt fortov i sydsiden af vejen. Arbejdet forventes at starte primo juni og slutter ultimo oktober.

